


塩原第2雨水幹線（2）築造工事 工事概要

発注者：道路下水道局西部下水道課

- 受注者：株式会社 藤原組 代表取締役 藤原 定司
- 契約金額：165,183,700 円

1 位置図

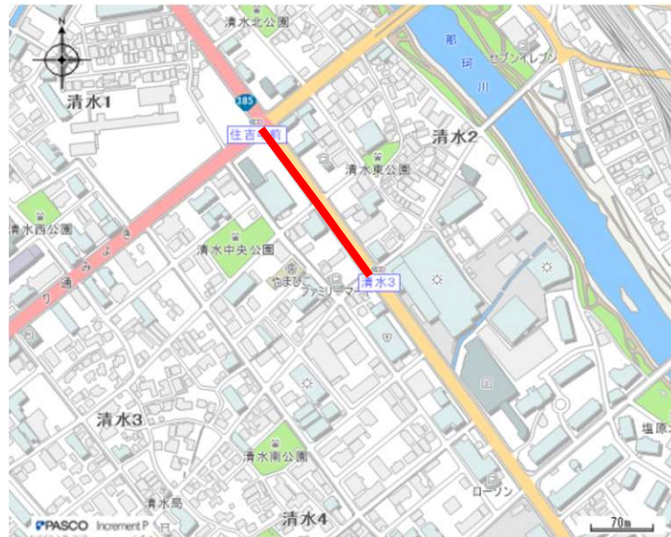

2 工事の概要

本工事は南区清水三丁目地内における既設雨水幹線の耐震化を目的とした管更生工事である。

- (1) 件名 塩原第2雨水幹線（2）築造工事
- (2) 場所 福岡市南区清水三丁目地内
- (3) 工期 R4.6.10 ~ R5.1.15
- (4) 内容 管更生工（クリアフロー工法）
 - 1400×1400 L = 105.70 m
 - 1200×1200 L = 98.9 m
 - 付帯工 1.0 式

3 工事写真



着手前



完成

4 特に顕著な事項

- ★施工方法の工夫
 - ・足場が必要なマンホールにおいて、接合部材が少ない足場を使用し、施工性が向上した。
 - ・管更生における充填材注入前、製管時に溜まった水をポンプにて排出した。
- ★地域への貢献
 - ・「一人一花」運動として周辺の公園の除草や、プランターを設置し、工事現場のイメージアップを図った。



足場工の工夫



充填剤注入前ポンプ使用状況



「一人一花」運動
